



桃園市政府 養護工程處

龜山區樂善國小及南美國小 周邊通學廊道改善工程

配合養工處辦理本校【通學廊
道改善工程】相關說明事項

預計施作位置

河濱步道
入口結束

既有人行道
鋪面改善

南美國小

路口改善

行穿線整併

南上路圍牆
開始



預計施作階段-(各階段可能同時段施作)



預計施工日期

◆ 工期預計9月16日至12月29日

➤ 9月12日-開始擺設槽鋼護欄

➤ 9月16日-正校門口兩旁開始施工

➤ 分區域施作

✓ 第一階段：正校門口(南上路)

✓ 第二階段：側門(南美街至接送區停車格尾端)


✓ 第三階段：側門(停車格尾端至河濱步道入口)



第一階段：正校門口(南上路)



第一階段施工— 正校門左方至校門臨時通學步道規劃說明

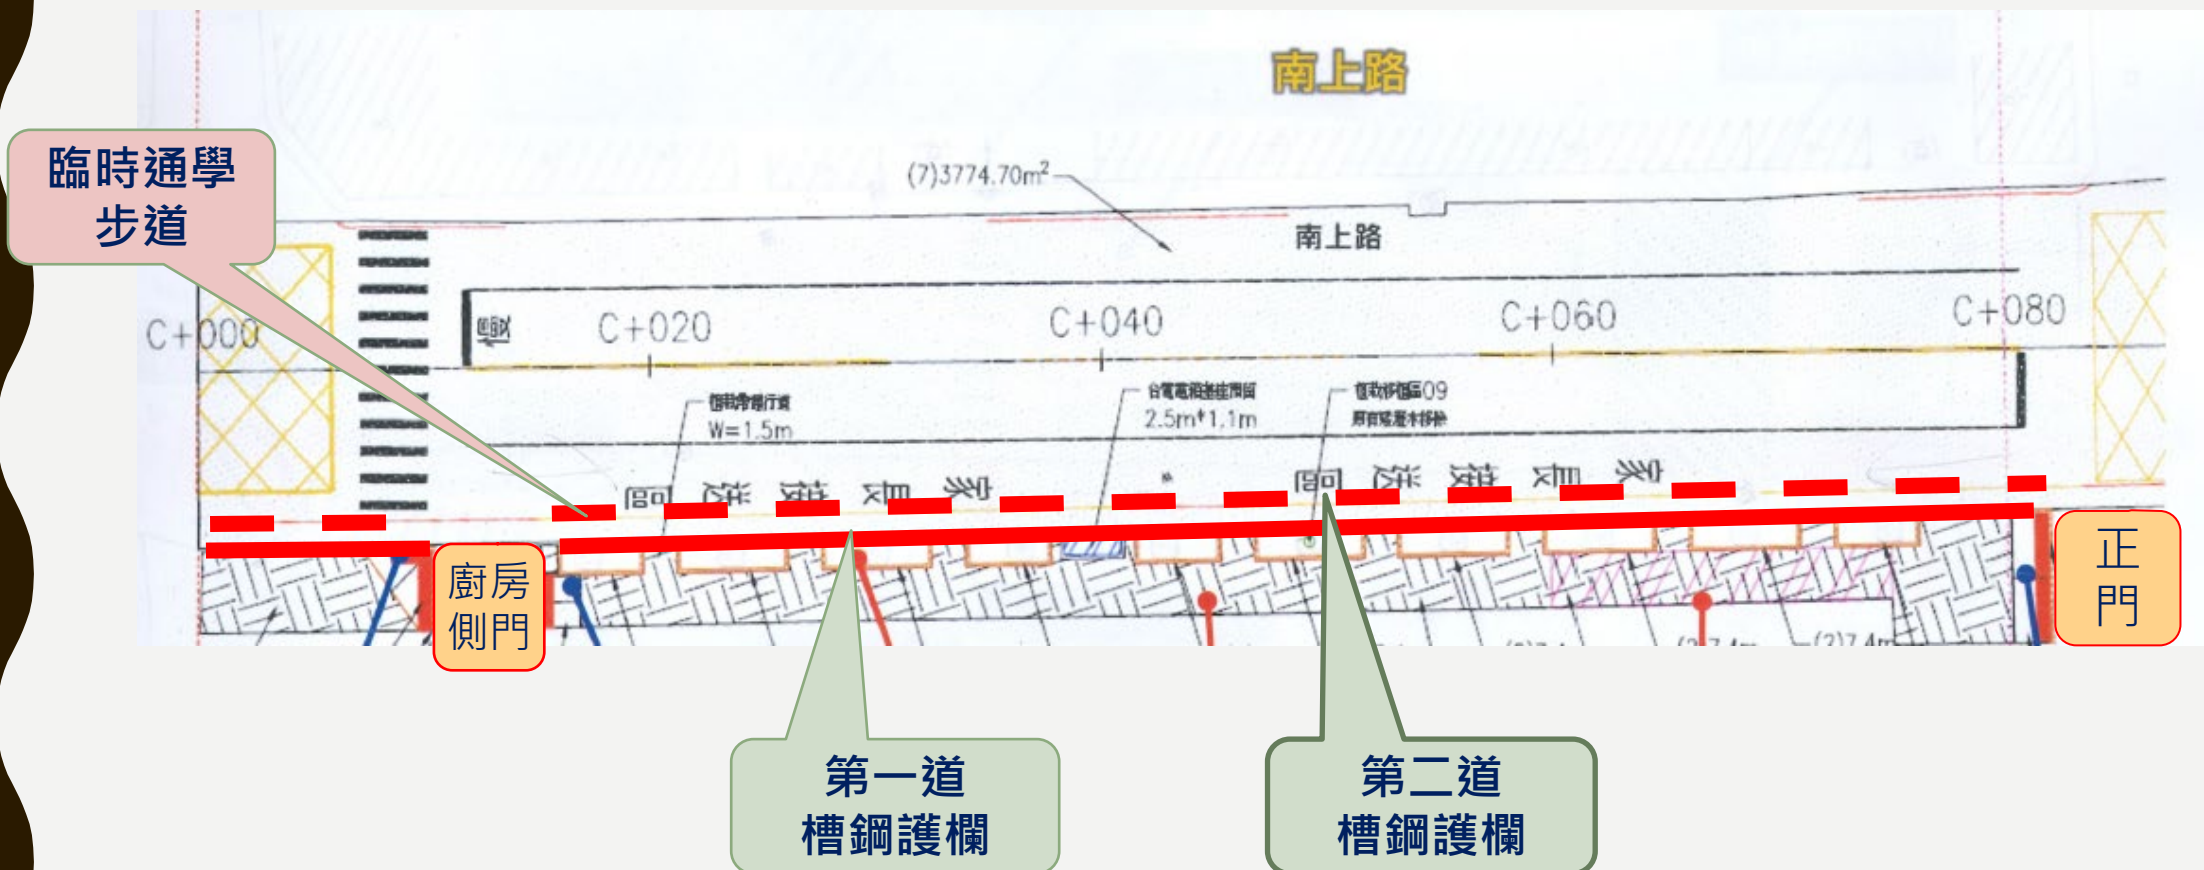

臨時通學步道調整放大示意圖




臨時通學
步道

第一道槽鋼護欄：
沿原有人行道緣石連續擺放

第二道槽鋼護欄：
離第一道護欄 90 CM
間隔擺放，方便學生進入

臨時通學
步道

第一階段施工— 正校門右方至校門臨時通學步道規劃說明

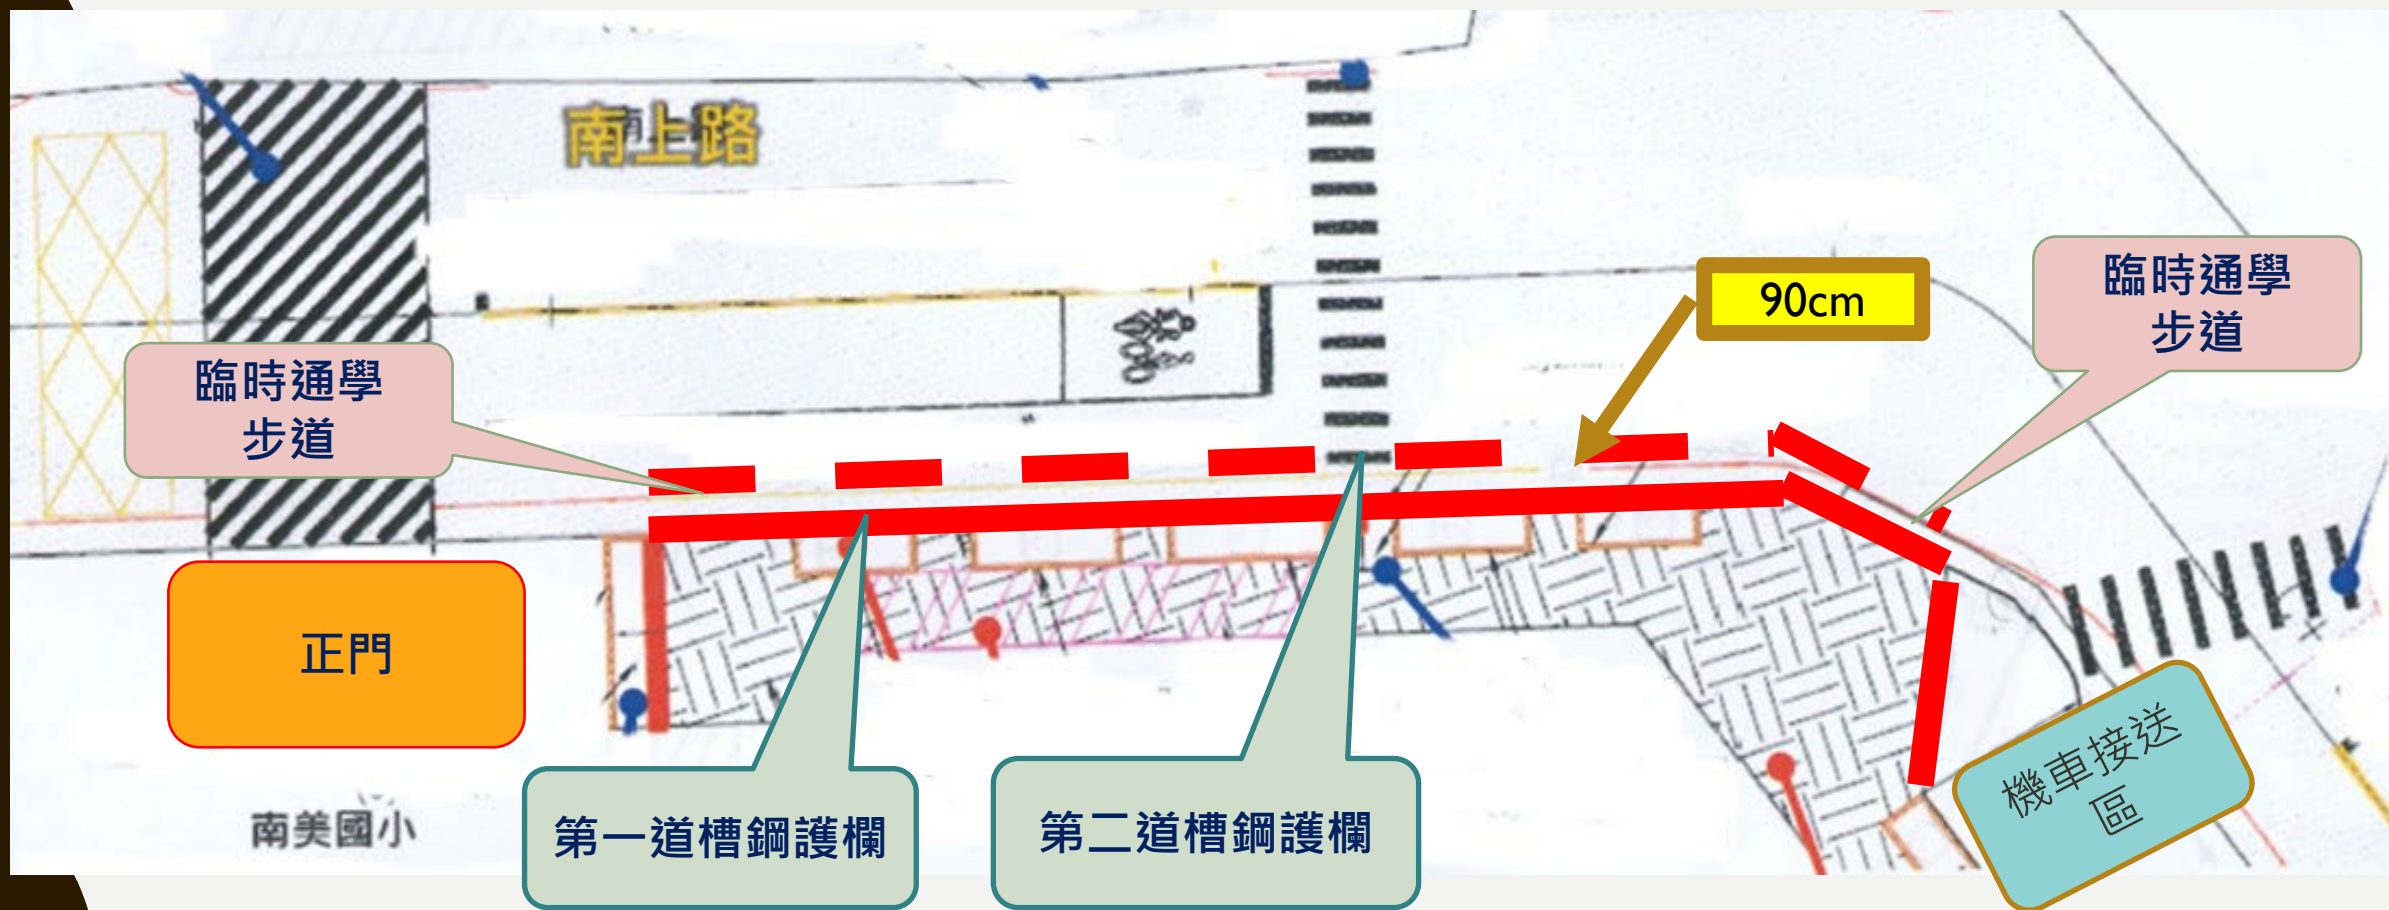

第一階段施工注意事項及規劃




- ❑ 原校門口左、右兩側人行道封閉，學生上、下學由臨時通道進入校園
- ❑ 機車接送統一至南美街機車接送區進行接送
- ❑ 施工期間南上路道路路寬縮減，建議家長可提前在前一個路口讓孩子下車，自行走進校園
- ❑ 低年級放學路隊因人行道施工，無法帶至原接送區等待，改於大門口集合等待家長接送

第二階段--側門(南美街至接送區尾端)



第二階段--側門(南美街至接送區)

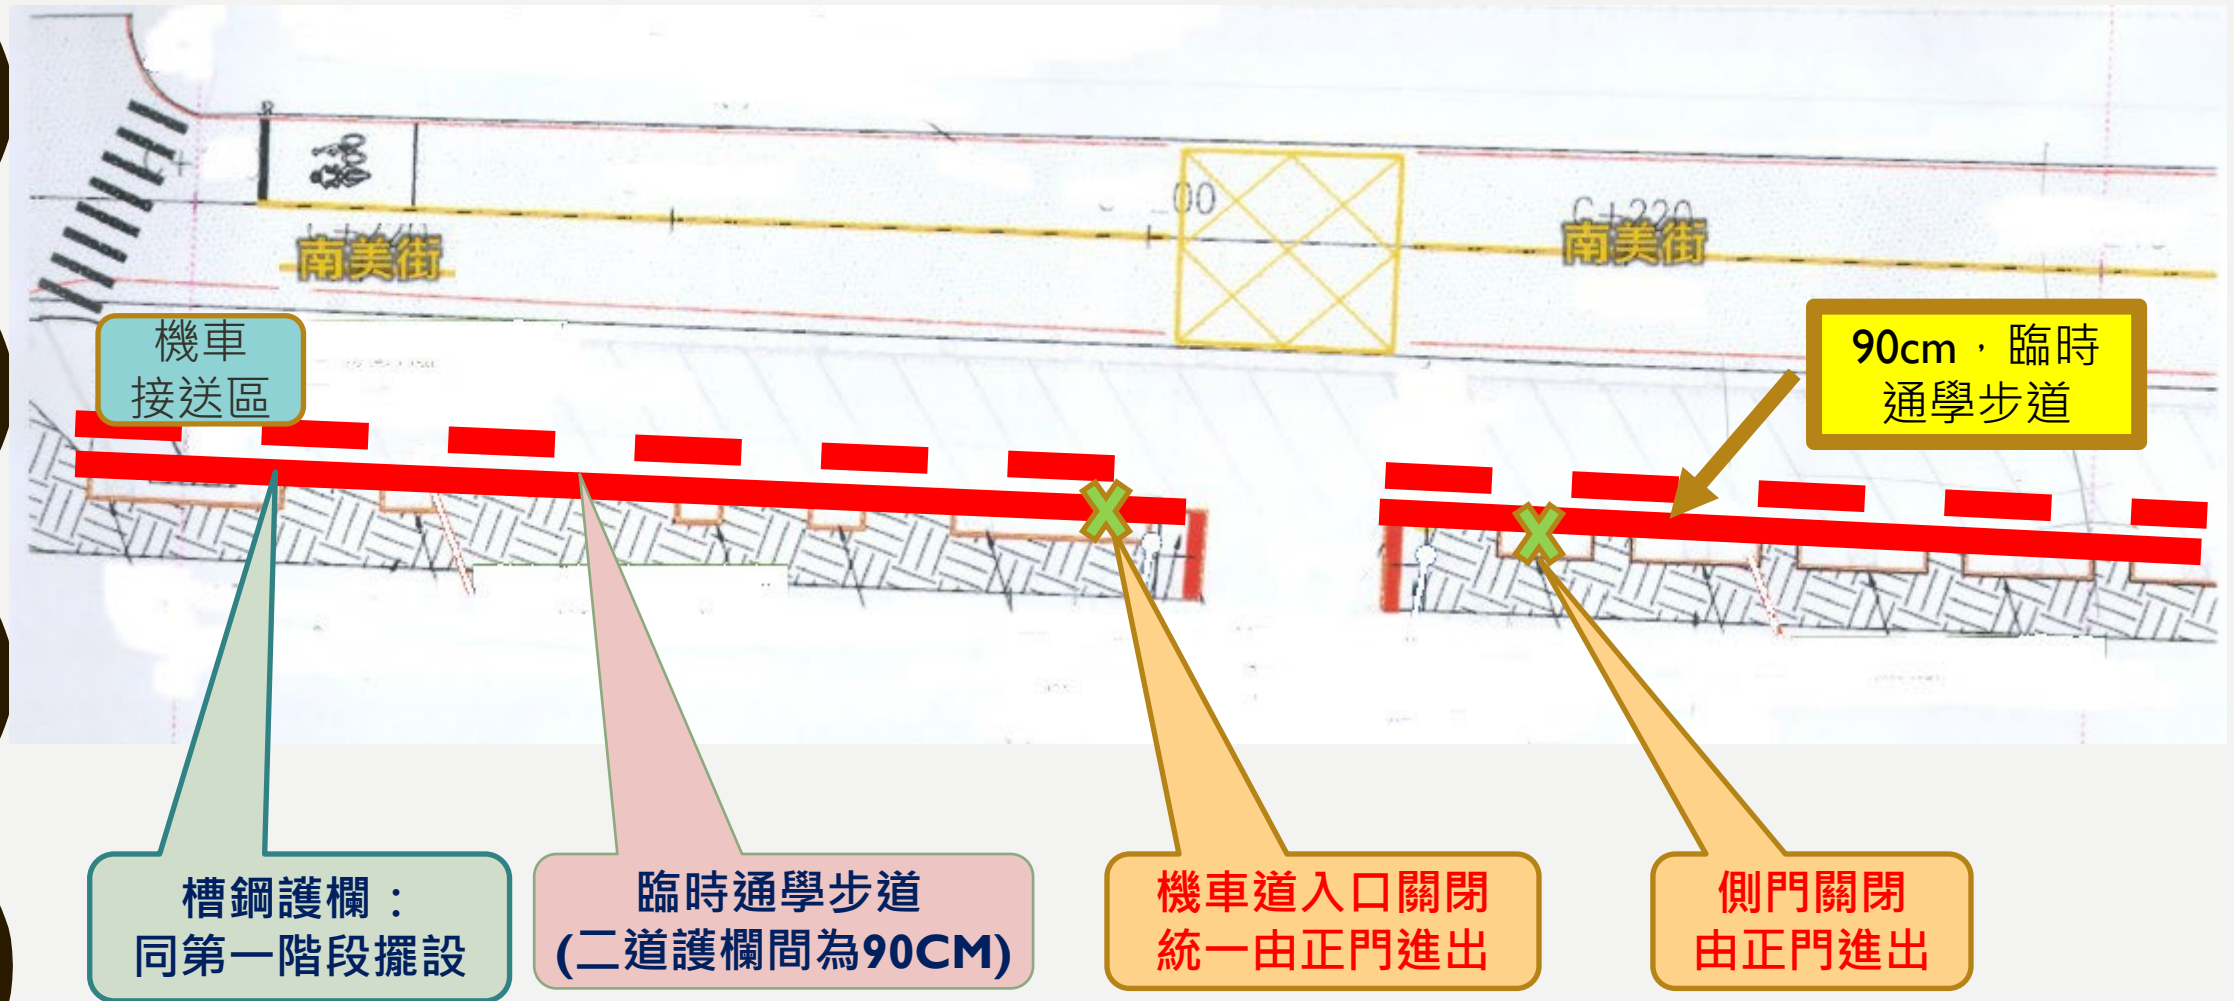

第二階段施工注意事項及規劃



槽鋼護欄放置示意圖



機車道入口關閉



側門關閉




教師機車由正門牽入

- 側門關閉，學生由正門進出，安親班路隊亦由正門帶出校園。
- 機車道入口關閉，請騎乘機車的老師統一由正門進出，為確保學生通行安全，請老師以牽行機車方式進入校園。
- 南美街接送區，因放置槽鋼護欄致停車空間變小，請家長於停放出入時注意。

第三階段：側門(停車格尾端至河濱步道入口)



第三階段施工— 臨時通學步道規劃說明

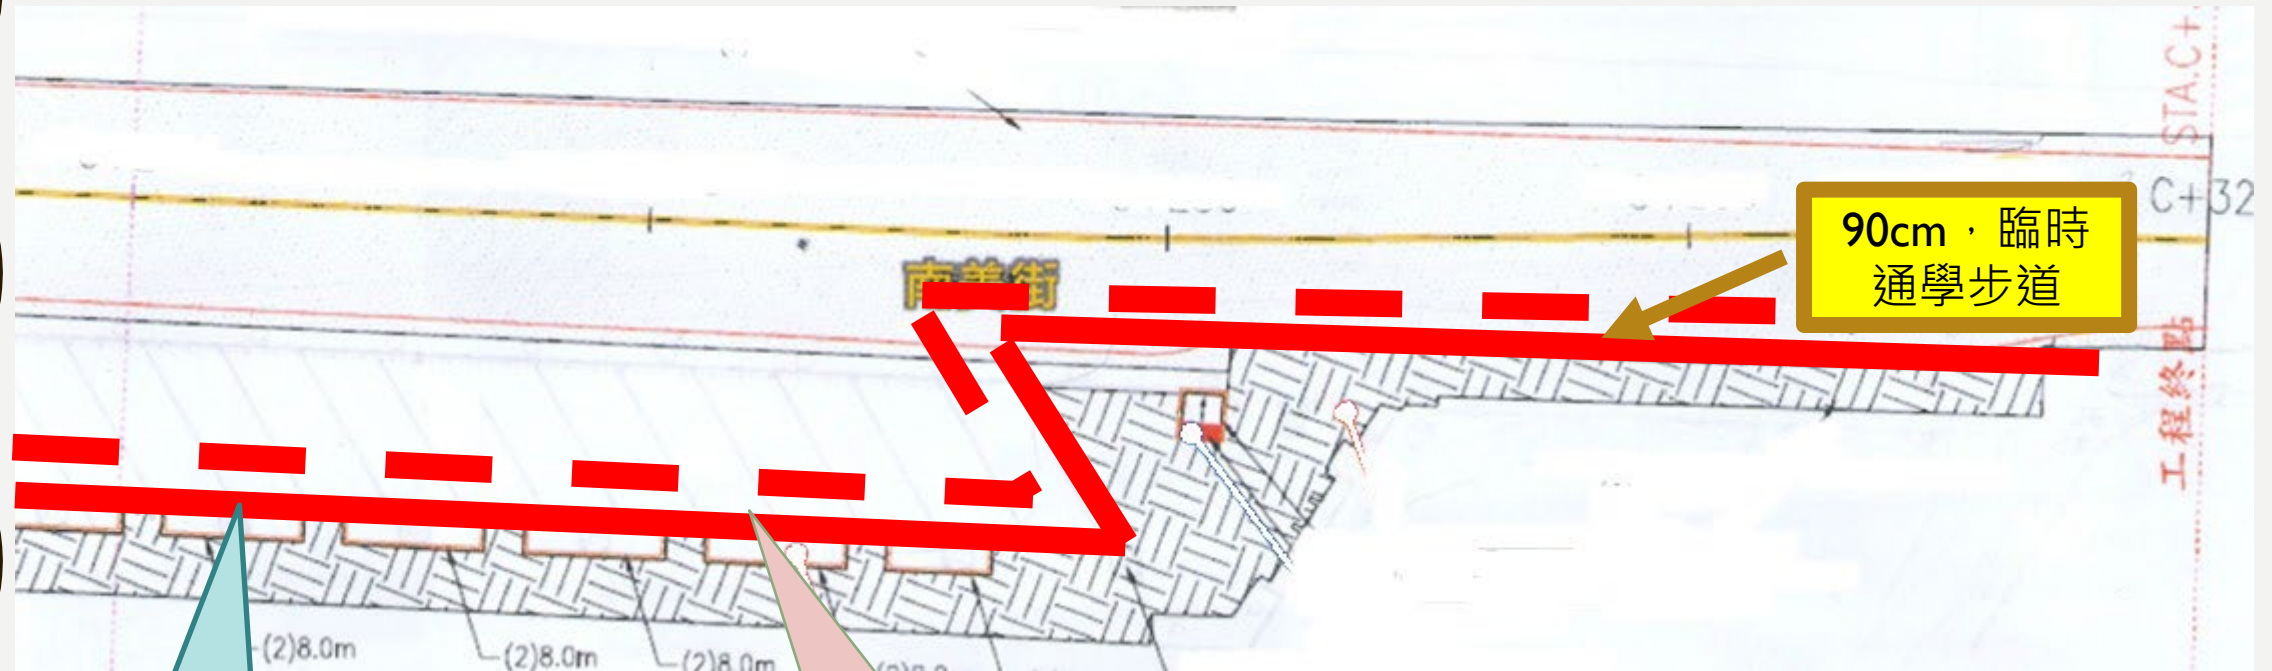

槽鋼護欄：
同第一階段擺設

臨時通步道
(二道鋼欄間為90CM)

第三階段施工注意事項及規劃



槽鋼護欄放置示意圖



機車道入口關閉



側門關閉



教師機車由正門牽入

- 第三階段施作時，第二階段預計仍在施工，故注意事項及規劃同第二階段
- 側門關閉，學生由正門進出，安親班路隊亦由正門帶出校園。
- 機車道入口關閉，請騎乘機車的老師統一由正門進出，為確保學生通行安全，請老師以牽行機車方式進入校園。
- 南美街接送區，因放置槽鋼護欄致停車空間變小，請家長於停放出入時注意。

工程施作說明及宣導

- ❑ 相關說明事項印製單張，請導師協助張貼於聯絡簿。
並於班親會宣導事項
- ❑ 施工圖示及說明公告於學校網頁。

學生上、放學接送因應措施

- ◆ 施工期間，南上路道路路寬縮減，家長送孩子上學時，可提前在前一個路口讓孩子下車，並依導護老師指揮過馬路，自行走進校園。
- ◆ 騎乘機車的家長，請將機車停放南美街機車接送區，進行接送。
- ◆ 低年級放學路隊因人行道施工，無法帶至原接送區等待，改於大門口集合等待家長接送，學務處也將視施工進程彈性調整學生放學路隊動線。

學生上、放學接送因應措施--

第二階段及第三階段

- ◆ 南美街(第2階段及第3階段)施工期間，側門關閉，學生由正門進出，安親班路隊亦由正門帶出校園。
- ◆ 機車道入口關閉，騎乘機車的老師統一由正門進出，為確保學生通行安全，請老師以牽行機車方式進入校園。
